


# 加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年5月1日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>開挖區</b>：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，提送地下水改善完成報告予環保局，目前環保局驗證中。</li> <li>2. <b>暫置區</b>：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉中。</li> </ol>	甲案 64.2% 乙案 73.5% 丙案 77.4% 全區 69.4%	甲案 83.2% 乙案 96% 丙案 93.1% 全區 88.4%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CCP 打設、鋼板樁打設等圍堵及假設工程作業</li> <li>2. 水洗設施建置(A、B案)及試運轉作業(C案)</li> <li>3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業</li> <li>4. 現地整治注藥及生物復育作業</li> <li>5. 基地內補充調查作業</li> </ol>	A案 15.1% B案 19.7% C案 20% 全區 17.3%	A案 16.6% B案 21.2% C案 20.3% 全區 18.5%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-

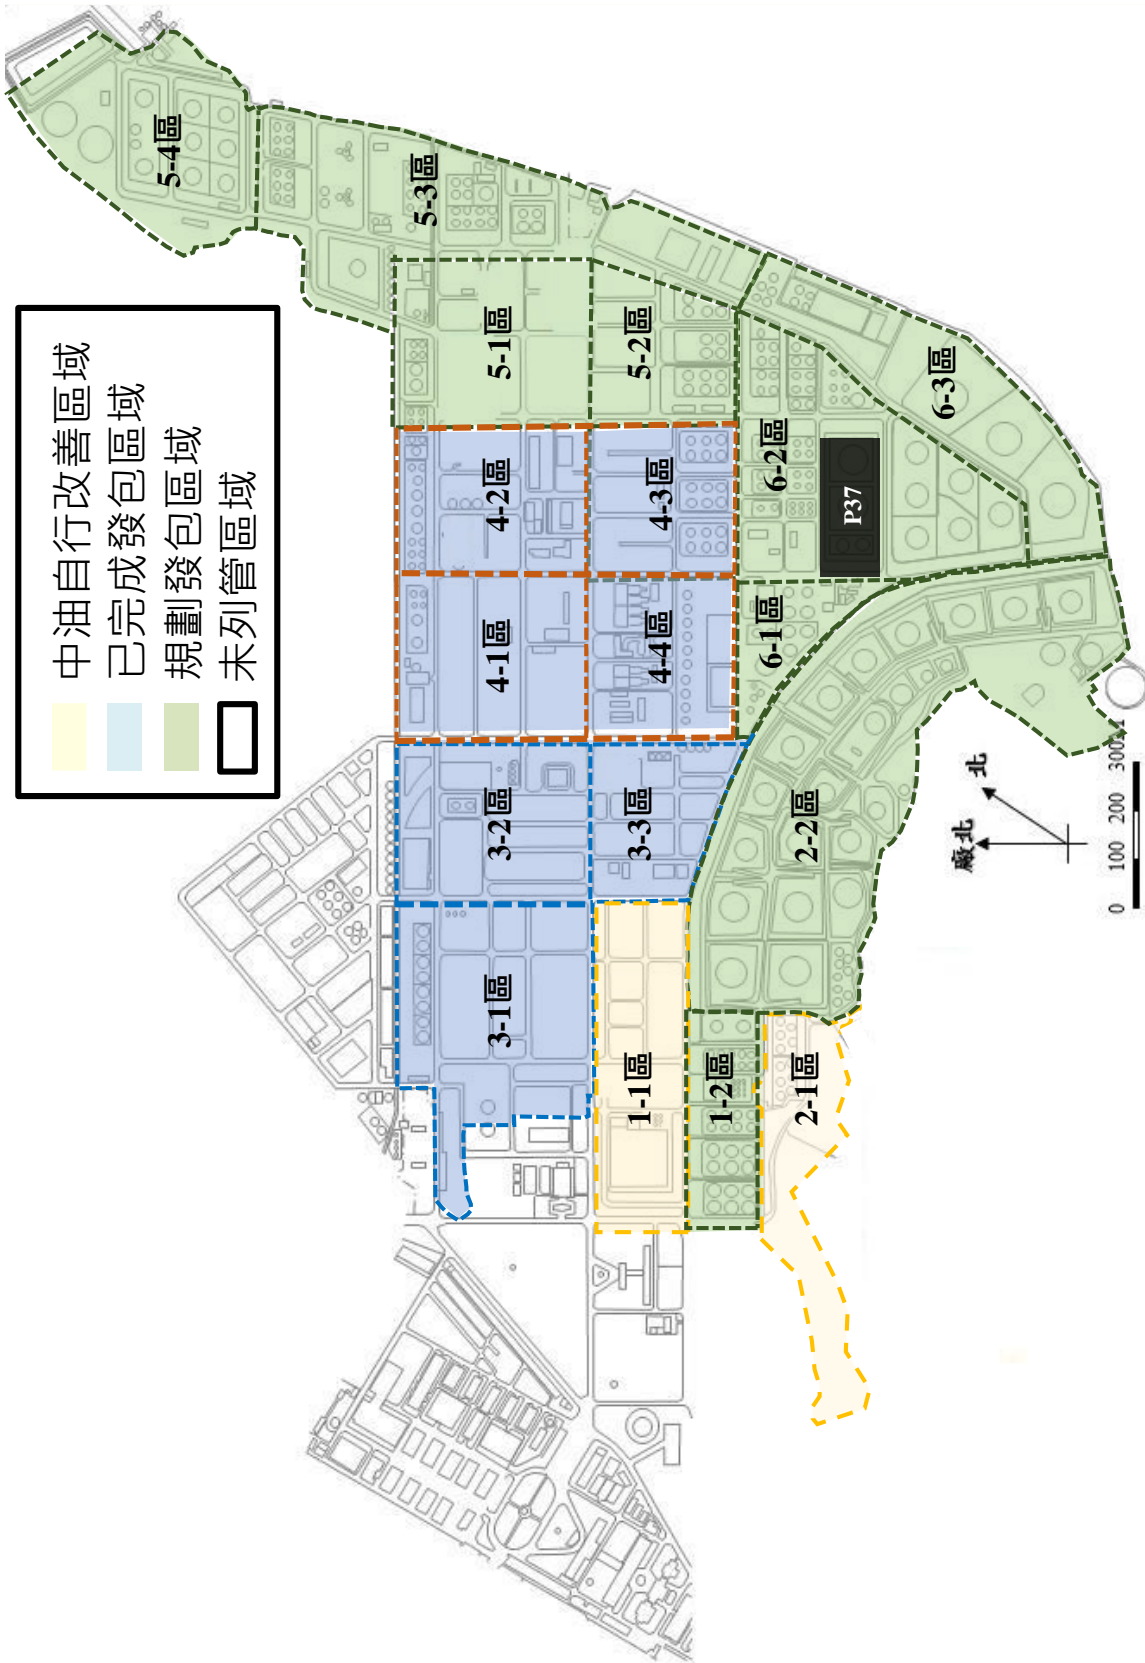

- 中油自行改善區域
- 已完成發包區域
- 規劃發包區域
- 未列管區域

